



	Piano per lo sviluppo delle reti elettriche gestite da AcegasApsAmga S.p.A.		
	REV. 0		PAG. 1 di 8
	DIREZIONE RETI		

PIANI DI SVILUPPO
DELLE RETI ELETTRICHE GESTITE DA AcegasApsAmga S.p.A.
2023-2027 e 2025-2029
RAPPORTO DI MONITORAGGIO AL
31.12.2025

REV. 0	31/03/2026	Emissione	
REDAZIONE	AMSILPSASSET MANAGEMENT Pianificazione degli Investimenti Energia	DATA 31/03/2026	FIRMA Ing. Fabio Fontanot 
	DIREZIONE RETI ENERGIA Conduzione e Manutenzione Energia Elettrica	DATA 31/03/2026	FIRMA Ing. Paolo Maria 
VERIFICA	Asset Management, Sistemi Informativi, Logistica e Progetti Sviluppo (AMSILPS)	DATA 31/03/2026	FIRMA Ing. Daniele Gallazzo 
	DIREZIONE RETI ENERGIA	DATA 31/03/2026	FIRMA Ing. Stefano Maestrini 
APPROVAZIONE TECNICA	DIREZIONE RETI	DATA 31/03/2026	FIRMA Ing. Giovanni Piccoli 

 AcegasApsAmga	Piano per lo sviluppo delle reti elettriche gestite da AcegasApsAmga S.p.A.		
	REV. 0		PAG. 2 di 8
	DIREZIONE RETI		

Sommario

Sommario

PREMESSA E CONTENUTO DEL DOCUMENTO	3
SINTESI AVANZAMENTO PIANI DI SVILUPPO 2023 E 2025.....	3
EVOLUZIONE DEI COSTI COMPLESSIVI DI INVESTIMENTO E INDICAZIONI SUL PROGRESSO TEMPORALE DEGLI INTERVENTI	3
EVOLUZIONE PERCENTUALE DEGLI INVESTIMENTI A VITA INTERA RIPARTITI PER FASE DI AVANZAMENTO	5
ELENCO COMPLESSIVO DEGLI ASSET DA REALIZZARE NELL'AMBITO DEL PIANO	5
<i>Elenco delle opere completate nel corso del 2025</i>	<i>7</i>
<i>Elenco degli interventi e opere "ritardate".....</i>	<i>7</i>

 AcegasApsAmga	Piano per lo sviluppo delle reti elettriche gestite da AcegasApsAmga S.p.A.		
	REV. 0		PAG. 3 di 8
	DIREZIONE RETI		

Premessa e contenuto del documento

Il presente rapporto, redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 60 dell'Allegato A alla deliberazione 27 dicembre 2023 numero 617/2023/R/eel dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) fornisce lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nel Piano di Sviluppo 2023-2027 (di seguito PdS23) e nel Piano di Sviluppo 2025-2029 (di seguito PdS25), predisposti come da deliberazione ARERA 28 giugno 2023 n. 296/2023/R/eel e trasmessi ad ARERA in data 30 novembre 2023, rispettivamente 30 giugno 2025, dopo la consultazione pubblica.

In particolare, viene fornito un quadro di sintesi sull'avanzamento temporale ed economico al 31 dicembre 2025 del PdS23 e del PdS25 e una sintesi tabellare (in formato editabile) che per ogni intervento di sviluppo riporta gli eventuali aggiornamenti in merito a stato di avanzamento, tempistiche di realizzazione, evoluzione degli investimenti e delle consistenze.

Il quadro di sintesi riporta:

- l'evoluzione dei costi complessivi di investimento previsti e indicazioni sul progresso temporale degli interventi;
- l'evoluzione della percentuale del volume di investimento delle opere del piano ripartito per fase di avanzamento;
- l'elenco complessivo degli asset da realizzare con dettaglio per principali categorie di asset;
- l'elenco (in forma tabellare) delle opere completate, ritardate o posticipate volontariamente (con indicazione dei motivi) ed elenco delle opere autorizzate o avviate in iter autorizzativo nel corso del 2025.

Sintesi avanzamento Piani di Sviluppo 2023 e 2025

Nei paragrafi seguenti vengono riportati gli aggiornamenti al 31 dicembre 2025 degli interventi di sviluppo oggetto del PdS23 e del PdS25.

Evoluzione dei costi complessivi di investimento e indicazioni sul progresso temporale degli interventi

Il perimetro oggetto di analisi comprende 20 interventi del PdS23 e 18 interventi del PdS25, tutti identificati da un codice intervento in ciascun Piano di Sviluppo, anche a seguito delle integrazioni inviate con ns. protocollo 162072/2025 del 9 dicembre 2025.

Il totale stimato degli investimenti a vita intera dei suddetti interventi ammonta al 31 dicembre 2025 a circa 21,2 M€ per gli interventi residui del PdS23, più circa 30,5 M€ per gli interventi del PdS25, con un investimento consuntivato a tutto il 2025 pari a circa 21 M€.

Al 31 dicembre 2025, come mostrato nella Tabella 1, il 68% degli interventi risulta in linea ovvero in anticipo rispetto alle tempistiche di entrata in esercizio previste, il 26% in ritardo ed il 5% in

posticipazione volontaria.

Progresso interventi al 31 dicembre 2025	Numero interventi	Investimenti consuntivati al 31.12.2025 (€)	Variazione investimento a vita intera (€)
In anticipo	5	1.538.942	673.314
Come da programma	20	17.305.428	989.205
In ritardo	10	2.143.374	202.861
Posticipazione volontaria	3	0	0
Cancellato	0	0	0
Totale complessivo	38	20.987.744	1.865.380

Tabella 1 – Avanzamento degli interventi del PdS23/PdS25 ed evoluzione costi di investimento al 31 dicembre 2025

La Figura 1 sintetizza le variazioni della pianificazione e dei costi complessivi di investimento e indicazioni sul progresso temporale degli interventi intercorsi durante il 2025.

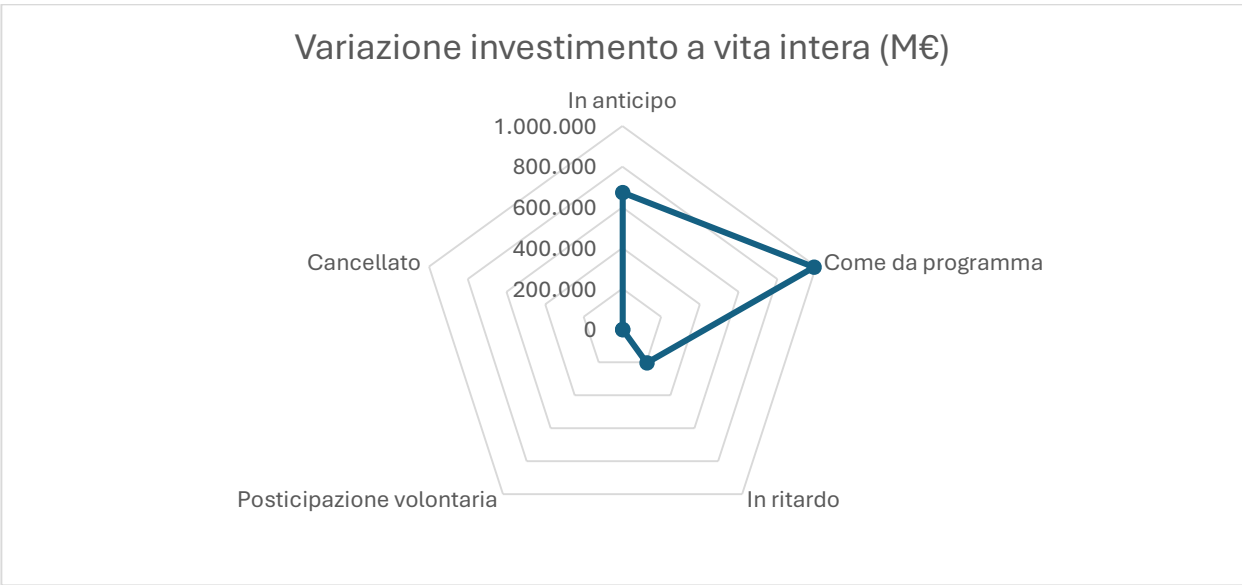


Figura 1– Avanzamento degli interventi ed evoluzione costi di investimento al 31 dicembre 2025

	Piano per lo sviluppo delle reti elettriche gestite da AcegasApsAmga S.p.A.		
	REV. 0		PAG. 5 di 8
	DIREZIONE RETI		

Evoluzione percentuale degli investimenti a vita intera ripartiti per fase di avanzamento

Nella successiva Figura 2 è rappresentata la percentuale degli investimenti delle opere del PdS23 e del PdS25 per fase di avanzamento.

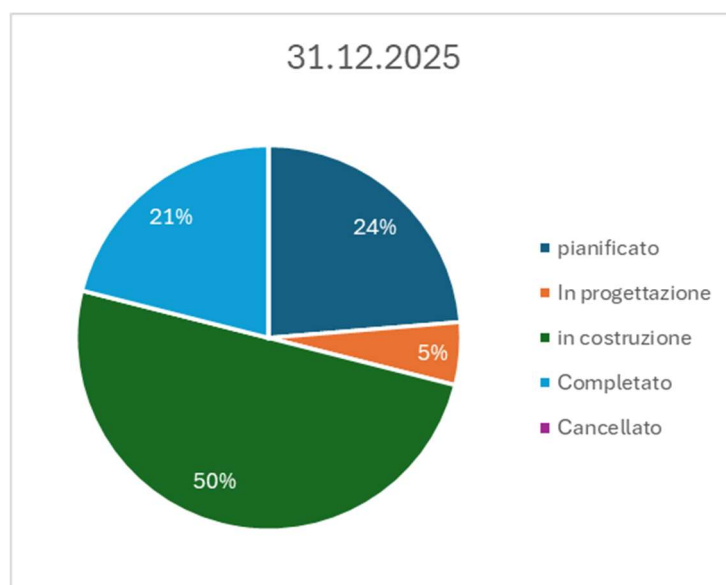


Figura 2 Evoluzione % degli investimenti per stato di avanzamento

Elenco complessivo degli asset da realizzare nell'ambito del Piano

Con la realizzazione dei rimanenti 20 interventi contenuti nel PdS23 e dei 18 interventi contenuti nel PdS25, si prevede:

- la realizzazione di una nuova Cabina Primaria AT/MT;
- la realizzazione di circa 19 km di nuove linee MT;
- la realizzazione di 10 nuove cabine secondarie MT/BT;
- il potenziamento di 41 cabine secondarie MT/BT;
- la realizzazione di ca 140 MVA di nuova capacità di trasformazione AT/MT e oltre 15 MVA di nuova capacità di trasformazione MT/BT.

Si riporta di seguito l'elenco degli asset da realizzare nell'ambito del PdS23, suddiviso per le seguenti principali categorie di asset: km nuove linee per tipologia (aereo e cavo terrestre o sottomarino) e livello di tensione, n. di cabine di trasformazione, nuova potenza trasformata in MVA.

	Piano per lo sviluppo delle reti elettriche gestite da AcegasApsAmga S.p.A.		
	REV. 0		PAG. 6 di 8
	DIREZIONE RETI		

Asset	Consistenza opere PdS23	Consistenza opere realizzate al 31/12/2025
km nuove linee aeree 380 kV	0	0
km nuove linee cavo 380 kV	0	0
km nuove linee aeree 220 kV	0	0
km nuove linee cavo 220 kV	0	0
km nuove linee aeree 132 kV	0	0
km nuove linee cavo 132 kV	0,6	0
# nuove Cabine Primarie	1	0
# nuove Centri Satellite	0	0
# nuove Cabine Secondarie	3	2
MVA nuova capacità di trasformazione AT/MT	140	0
MVA nuova capacità di trasformazione MT/MT	6	6
MVA nuova capacità di trasformazione MT/BT	>1,2	4,17
MVAr di reattori	0	0

Tabella 2 – Elenco asset da realizzare suddiviso per categoria – PdS23

Asset	Consistenza opere PdS25	Consistenza opere realizzate al 31/12/2025
km nuove linee aeree 380 kV	0	0
km nuove linee cavo 380 kV	0	0
km nuove linee aeree 220 kV	0	0
km nuove linee cavo 220 kV	0	0
km nuove linee aeree 132 kV	0	0
km nuove linee cavo 132 kV	0	0
km nuove linee cavo 27,5 kV	5,530	0,891
km nuove linee cavo 20 kV	0,380	0,183
km nuove linee cavo 10 kV	4,915	0,063
km rinnovo linee aeree 400 V	7,501	0
km rinnovo linee cavo 400 V	14,602	0
km nuove linee cavo 400 V	1,532	1,065
# nuove Cabine Primarie	0	0
# nuove Centri Satellite	0	0
# nuove Cabine Secondarie	9	5
MVA nuova capacità di trasformazione AT/MT	0	0
MVA nuova capacità di trasformazione MT/MT	0	0
MVA nuova capacità di trasformazione MT/BT	14,855	3,300
MVAr di reattori	0	0

Tabella 3 – Elenco asset da realizzare suddiviso per categoria – PdS25

	Piano per lo sviluppo delle reti elettriche gestite da AcegasApsAmga S.p.A.		
	REV. 0		PAG. 7 di 8
	DIREZIONE RETI		

Stato avanzamento delle opere

Nel seguito viene data evidenza delle:

- opere completate nel corso del 2025;
- opere per le quali è stato registrato un ritardo che comporta lo slittamento delle data di completamento;

Nel presente periodo di monitoraggio non sono presenti opere che ricadono nelle casistiche:

- opere per le quali è stato ottenuto il decreto autorizzativo per la costruzione e l'esercizio nel corso del 2025;
- opere per le quali è stata avanzata agli Enti competenti la richiesta di autorizzazione nel corso del 2025.

Elenco delle opere completate nel corso del 2025

Con riferimento alle opere associate agli interventi del PdS23 e del PdS25 risultano completate nel corso del 2025 n. 6 opere:

Elenco Opere completate al 31/12/2025					
Comune	Codice	Nome intervento	Avvio attività	Avvio realizzazione	Completamento
Trieste	acegasapsamga-PdS2023-004	TRS_MT_BT	2023	2024	2025
Trieste	acegasapsamga-PdS2023-005	PIATTAFORME CALCOLI MT E BT	2023	2025	2025
Trieste	acegasapsamga-PdS2023-006	CONNETTIVITÀ FIBRA OTTICA CP BROLETTO, VALMARTINAGA E ROIANO	2023	2025	2025
Trieste	acegasapsamga-PdS2023-017	Adeguamento rete MT via Trieste da 10 a 20 kV	2023	2023	2025
Trieste	acegasapsamga-PdS2023-023	Rete Cattinara RFI 10kV	2023	2022	2025
Trieste	acegasapsamga-PdS2023-025	Rete Hotel Riviera	2023	2023	2025
Gorizia	acegasapsamga-PdS2025-006	RINNOVO CABINE SECONDARIE GORIZIA	2025	2024	2025
Gorizia	acegasapsamga-PdS2025-010	NUOVA REALIZZAZIONE CONNESSIONI MT - GORIZIA	2025	2024	2025

Tabella 4 – Elenco opere completate nel 2025

Elenco degli interventi e opere “ritardate”

Al 31.12.2025 risultano in ritardo, ovvero con data di completamento slittata rispetto a quella riportata nella rendicontazione al 31.12.2024 del PdS23 ovvero nel PdS25, n. 10 interventi.

Nella Tabella 5 sono riportati gli interventi oggetto di ritardo e le relative motivazioni.

	Piano per lo sviluppo delle reti elettriche gestite da AcegasApsAmga S.p.A.		
	REV. 0		PAG. 8 di 8
	DIREZIONE RETI		

Elenco Interventi in ritardo			
Comune	Codice	Nome intervento	Motivazione ritardo
Trieste	acegasapsamga-PdS2023-008	Cabina Porto Vecchio Magazzino 26	Adeguamenti al progetto per vincoli monumentali
Trieste	acegasapsamga-PdS2023-009	Via Romagna 2kV rinnovo a 10kV (ambito GG parzialmente)	Estensione in corso d'opera alla parte bassa della via
Trieste	acegasapsamga-PdS2023-021	Cabina Hotel Riviera	Perfezionamento pratiche di costituzione servitù
Trieste	acegasapsamga-PdS2023-022	Cabina Mercantini	Ampliamento dell'intervento previsto, a causa di approfondimenti sul fabbricato della cabina emersi in fase esecutiva
Trieste	acegasapsamga-PdS2023-023	Rete Cattinara RFI 10kV	Imprevisti in corso d'opera (attraversamento ferroviario e salita fronte monte)
Trieste	acegasapsamga-PdS2023-024	Rete 30kV Ospedale - Cattinara	Legato a realizzazione ampliamento dell'ospedale, attualmente bloccato
Trieste	acegasapsamga-PdS2023-026	Stazione marittima Molo Bersaglieri	Legato a intervento acegasapsamga-PdS2023-002
Trieste	acegasapsamga-PdS2025-001/1	Rinnovo Linee BT cabina 10312 - p.le Giarizzole 16	Ridefinizione priorità di intervento
Gorizia	acegasapsamga-PdS2025-004	RINNOVO LINEE MT (INTERRAMENTO LINEE AEREE)	Difficoltà esecutive
Trieste	acegasapsamga-PdS2025-009	NUOVA REALIZZAZIONE CONNESSIONI MT - TRIESTE	Attesa lavori cliente / ritardi nella consegna materiali / modifiche progettuali

Tabella 5 – Elenco opere in ritardo
